

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA GRANICA

**Razmatra:** Općinsko vijeće

**Predlaga :** Općinski načelnik

**Obrađivač:** Služba za poduzetništvo,  
lokalni razvoj i finansije

**IZVJEŠTAJ**  
**o realizaciji Programa**  
**kapitalnih investicija Općine**  
**Granica u 2015.godini**

Granica, april 2016.god.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA GRAČANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE

**Broj predmeta:** 01-05-03105-2017  
**Broj akta:** 01DT-001  
Gračanica, 28.09.2017. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 28.09.2017. godine, d o n o s i

## Z A K L J U Č A K

### I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija za 2015. i 2016. godinu.


### II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Nihad Krajinović

# OPĆINA GRAČANICA

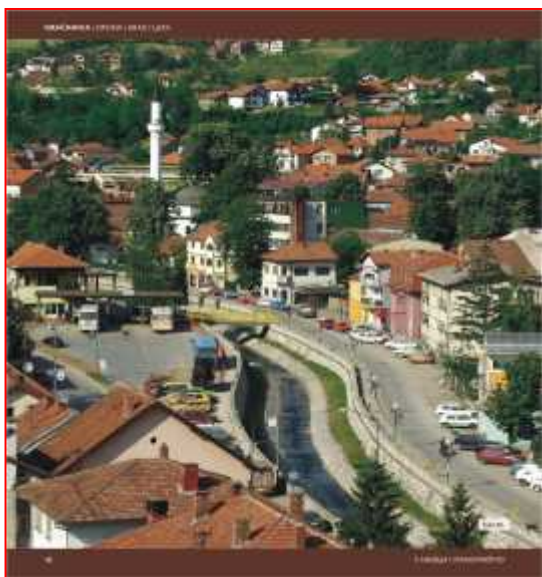

**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA  
OPĆINE GRAČANICA  
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE**



**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA  
OPĆINE GRAČANICA  
ZA PERIOD OD 2016. do 2020.GODINE**

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2015.GODINI  
KOJI SU REALIZOVANI U PERIODU  
IZME U PKI 2010-2014 I PKI 2016-2020**

Gračanica, novembar 2016.godine

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2015.GODINI  
KOJI SU REALIZOVANI U PERIODU  
IZME U PKI 2010-2014 I PKI 2016-2020**

**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA  
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE**

Izradom Programa kapitalnih investicija op ine Gra anica 2010-2014.godine uz pomo i saradnju sa projektom GAP-a je poboljšan ukupan proces planiranja, po evši od utvr ivanja prioriternih projekata, preko javnih nabavki, monitoringa i izvršenja ugovorenih gra evinskih radova do kasnije evaluacije.

Program je djelimi no realizovan zbog velikog broja prijedloga projekata.

**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period od 2010.-2014.godine** usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2010.godine.

U Programu kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Do sada ura eno, razmatrano i usvojeno:

- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u 2010.godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2011. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u 2011. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2012. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03684-2012 od 30.08.2012. godine
- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u 2012. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2013. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2013. godine
- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u 2013. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2014. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03721-2014 od 30.10.2014. godine

- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u 2014. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju ak broj 01-05-01242-2015 od 29.04.2015. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2015. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine
- Završena evolucija cijelog Programa

Pošto pripremljen Program Kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2015-2016 nije bio na razmatranju Op inskog vije a u 2015.godini, sada je ura en

- **Izvještaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2010-2014**

kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, a svi projekti iz Programa kapitalnih investicija op ine Gra anica 2010-2014 i novi projekti su uvršteni u novi program koji je sada na razmatranju.

Ura en je novi PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA ZA PERIOD OD 2016. do 2020.GODINE

tako da je pripremljen Program kapitalnih investicija 2016-2020 po istom principu kao i ranije program i istoj metodologiji, u kojem su se uvrstiti svi nerealizovani projekti koji su bili u ranijem programu i projekti koji su pristigli kao novi po javnom pozivu iz 2015.

# IZVJEŠTAJ

## o realizaciji projekata u 2015.godinu

### iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014

Od planiranih projekata za realizaciju u 2015. godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da su projekti planirani za realizaciju prema usvojenom Budžetu za 2015.godinu, od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od 7.364.672 KM u 2015.godini realizovano je 75,22 % ukupne vrijednosti projekata a što iznosi **5.539.433,00 KM**.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2015.godini realizovani su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 1.071.302 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 907.166 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 613.454 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.487.126 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 250.817 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 1.209.568 KM

Imaju li u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2015.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarne nepogode i prirodne nesreće i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE U 2015.godini PROJEKATA iz  
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRADANICA 2010.-2014.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Realizacija u 2015.god								
		Izvori finansiranja							
grupa ↓	realizovano	Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	gradani	donacije
<b>GRUPA I</b>									
sport, kultura, potrebe manjina	<b>1.071.302</b>	693.647	0	300.000	62.655	0	0	5.000	10.000
<b>GRUPA II</b>									
toplifikacija, deminiranje	<b>907.166</b>	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	153.015
<b>GRUPA III</b>									
vodovod, kanalizacija	<b>613.454</b>	249.393	137.071	0	0	0	226.990	0	0
<b>GRUPA IV</b>									
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	<b>1.487.126</b>	1.328.204	0	0	0	158.922	0	0	0
<b>GRUPA V</b>									
oprema, dokumentacija	<b>250.817</b>	242.817	0	0	0	3.000	0	5.000	0
<b>GRUPA VI</b>									
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	<b>1.209.568</b>	774.831	0	0	434.737	0	0	0	0
<b>ukupno</b>	<b>5.539.433</b>	<b>3.298.258</b>	<b>137.071</b>	<b>309.366</b>	<b>497.392</b>	<b>897.341</b>	<b>226.990</b>	<b>10.000</b>	<b>163.015</b>

## AŽURIRANJE u 2016.g. -IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

### GRUPA I

### SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	označka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodovi	ostaje za realizaciju	
								PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani			Donacije
1	2012 /I /1	Sajam 2012 <b>Gra anica</b>	350.000	0	350.000	30.000	0	290.000	15.000	0	0	5.000	10.000	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	171	14.000
3	2012 A /I /2	Izložba stonog arstva „Gra anica i Doboju-Istok“ <b>(povećana vrijednost)</b>	52.000	39.000	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	150	0
4	2012 A/I/ 6	Ljetne večeri pod lipama <b>Gra anica</b> <b>(povećana vrijednost)</b>	90.000	63.585	14.415	14.415	0	0	0	0	0	0	0	94	12.000



5	2010 /I /5	Informatizacija biblioteke i obna vljanje knjižnog fonda-BKC u MZ <b>Gra anica</b>	100.000	32.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	87	66.000
6	2012 /I /3	Sanacija kulturno- histotijskih spomenika na <b>op ini</b>	50.000	10.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	39.470
7	B- 2013	sanacija i projek tovanje kulturno historiskog i zašti enog spomenika Pravoslavna crkva u MZ <b>Gra anici</b>	0	0	1.674	1.674	0	0	0	0	0	0	0		-1.674
8	B- 2013	sanacija i projekt ovanje kulturno historiskog i zašti enog spomenika SAHAT KULA u <b>Gra anici</b>	0	0	6.780	6.780	0	0	0	0	0	0	0		-6.780
9	B- 2015	budžet-Izgradnja poligona malih sportova na lokaciji VIS -Kari i u MZ <b>Babi i</b>	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
10	2012 /I /11	Izgradnja poligona u MZ <b>Buk</b> (pove ana vrijednost)	62.000	47.753	12.325	12.325	0	0	0	0	0	0	0	44	1.922
11	B- 2015	Izgradnja poligona u MZ <b>Donja</b> <b>Orahovica</b>	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	42	0
12	2011 /I /8	Obrazovanje roma na podru ju <b>op ine</b>	20.000	12.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	40	5.000

13	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije na području općine	40.000	27.500	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0	0	35	4.838
14	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma na području općine	15.000	12.452	2.548	2.548	0	0	0	0	0	0	0	33	0
15	B-2015	Budžet-grantovi pojedincima-jednokratne pomoći (povećana vrijednost)	20.000	0	18.550	18.550	0	0	0	0	0	0	0		1.450
16	B-2015	Budžet-pomoć najugraženijim penzionerima i drugim kategorijama stanovništva (povećana vrijednost)	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0		0
17	B-2015	Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja (povećana vrijednost)	38.000	0	36.247	36.247	0	0	0	0	0	0	0		1.753
18	B-2015	Budžet-stipendiranje učenika i studenata	100.000	0	97.800	97.800	0	0	0	0	0	0	0		2.200
19	B-2015	Budžet-grantovi za obrazovanje(stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbenika, mjesečne karte) (povećana vrijednost)	20.000	0	18.555	18.555	0	0	0	0	0	0	0		1.445

20	B-2015	Budžet-pomo za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih (povećana vrijednost)	10.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
21	B-2015	Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca (povećana vrijednost)	20.000	9.296	7.405	7.405	0	0	0	0	0	0	0	0	3.299
22	B-2015	Budžet-Omladinski centar Građanica-ANEJA	11.000	7.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
23	B-2015	Budžet-grant Budžet za mlade (povećana vrijednost)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B-2015	Budžet-projekat grant NVO (javni poziv) (povećana vrijednost)	78.000	43.223	34.932	34.932	0	0	0	0	0	0	0	0	-155
25	B-2015	Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja (povećana vrijednost)	25.000	0	24.983	24.983	0	0	0	0	0	0	0	0	17
26	B-2015	Budžet-izdaci za zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka (povećana vrijednost)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B-2015	Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke (povećana vrijednost)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	B-2015	Budžet-održavanje sportskih terena (povećana vrijednost)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B-2015	Budžet-izgradnja poligona u MZ <b>Dobrovci</b>	10.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
30	B-2015	Budžet-izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	90.000	0	76.324	76.324	0	0	0	0	0	0	0	13.676
31	2013/A/I	<b>REMIDA</b> projekat-pametni energetske lanci i zajednice u mediteranskom području	70.000	0	69.447	69.447	0	0	0	0	0	0	0	553
32	B-2015	Budžet-poligon u MZ <b>Lukavica</b>	10.000	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	100
33	B-2015	Budžet-igralište u MZ <b>Piskavica</b>	10.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
34	B-2015	Budžet-dječje igralište u MZ <b>Škakovica</b>	10.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
35	B-2015	Budžet-grant za OŠ u MZ Soko-5000, OŠ u MZ Stjepan Polje-3000)	10.000	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	2.200
36	B-2014	Budžet-izgradnja spomen obilježje u MZ <b>Donja Orahovica</b>	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B-2015	Budžet-izgradnja spomen obilježje u MZ <b>Mirina</b>	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

38	B-2015	Budžet-posticaji u poljoprivredi (povećana vrijednost)	60.000	0	57.455	9.800	0	0	47.655	0	0	0	0		2.545
UKUPNO KM			1.577.000	310.339	1.071.302	693.647	0	300.000	62.655	0	0	5.000	10.000	984	195.359

## GRUPA II

## TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodovi	ostaje za realizaciju	
								PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani			Donacije
1	2010/II/1	Toplifikacija grada	5.500.000	2.076.581	754.151	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	0	203	2.669.268
2	2012/A/II/5	Deminiranje područja općine - lokacija vodovod D. Skipovac-Lukavica (P=43.917,14m <sup>2</sup> )	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	94	0
3	2010/II/12	Deminiranje područja općine - MZ Malešići - lokacija Malešići-Javor (P=33.007,55 m <sup>2</sup> )	66.015	0	66.015	0	0	0	0	0	0	0	66.015		0
UKUPNO KM			5.653.015	2.076.581	907.166	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	153.015	297	2.669.268

## GRUPA III

## VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani	Donacije	Bodo vi	ostaje za realizaciju
1		izdaci za uslugu revizije projekta finansirane iz <b>EIBa</b>	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0		-3.000
2	B-2013	Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a	0	0	108.349	108.349	0	0	0	0	0	0	0		-108.349
3	2010/III/8	Centralni vodovod «Škahovica» - MZ <b>Škahovica</b> (zemljište 4.500+4902)	263.000	4.000	9.402	9.402	0	0	0	0	0	0	0	146	249.598
4	2011/III/33	Vodosnabdijevanje-rekonstrukcija glavne mreže i poboljšanje kapaciteta u MZ <b>Trnovci</b>	35.000	20.000	9.201	9.201	0	0	0	0	0	0	0		5.799
5	B-2013	budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Malešići</b>	70.000	48.105	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	146	19.395
6	2011/III/32	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i obezbjeđenje novih količina pitke vode u MZ <b>Piskavica</b>	10.000	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0		400
7	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Varoš I u MZ Gračanica	66.500	0	39.359	0	39.359	0	0	0	0	0	0		27.141

8	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Varoš II u MZ Gra anica	13.000	0	8.881	0	8.881	0	0	0	0	0	0	4.119
9	B-2015	budžet-fekalna kanalizacija u naselju Drama u MZ Gra anica	90.300	0	88.831	0	88.831	0	0	0	0	0	0	1.469
10	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Hajdarovac-Ritaši i u MZ Gra anica	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
11	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Bazen III u MZ Gra anica	10.000	0	6.764	6.764	0	0	0	0	0	0	0	3.236
12	B-2015	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Mehmedovi i u MZ Džakule	21.000	0	20.259	20.259	0	0	0	0	0	0	0	741
13	B-2015	radovi na ogra ivanju zaštitinih zona izvorišta u Mz <b>Gornji Doborovci</b>	10.000	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
14	B-2015	budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Babi i</b>	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B-2015	budžet - vodosnabdijevanje (izgradnja potisnog voda i bazena) u <b>MZ Babi i i MZ Maleši i</b>	300.000	0	226.990	0	0	0	0	0	226990	0	0	73.010
16	B-2014	Budžet 2014-kanalizacija u MZ <b>Soko-Bukva</b>	46.000	0	43.401	43.401	0	0	0	0	0	0	0	2.599

17	B-2015	budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Donja Orahovica</b>	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	B-2015	budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Miri na</b>	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
19	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Lukavica</b>	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
20	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Džakule-Kulovi i</b>	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
21	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Džakule-Bukovac</b>	15.000	0	11.417	11.417	0	0	0	0	0	0	0	3.583	
22	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Stjepan Polje</b>	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
23	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Buk</b>	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
24	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ <b>Rašljeva</b>	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	
25	B-2015	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Džebe u MZ <b>Stjepan Polje</b>	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
UKUPNO KM			1.173.800	72.105	613.454	249.393	137.071	0	0	0	226.990	0	0	292	488.241



## GRUPA IV

## PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodo vi	ostaje za realizaciju
								PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani		
1	2016 /I /2	Nastavak izgradnje PKSC Gra anica (2016-2018)	270.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	170	252.000
2	2016 /IV /2	završetak nove zgrade op ine (2016-2017)	300.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	125	180.000
3	2013 /IV /7	Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ <b>Gra anica</b>	93.000	0	92.968	92.968	0	0	0	0	0	0	119	32
4	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE u MZ <b>Gra anica</b>	300.000	50.020	158.922	0	0	0	158.922	0	0	0	116	91.058
5	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ <b>Gornjoj Orahovici</b> (pove ana vrijedno st na 110000)	110.000	94.459	14.446	14.446	0	0	0	0	0	0	83	1.095
6	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci- Pan urište u MZ <b>Doborovci</b>	330.000	201.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	66	89.000
7	2012 /IV /33	Izgradnja pješa kog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Sportska sala) u MZ <b>Gra anica</b>	50.000	0	46.293	46.293	0	0	0	0	0	0	66	3.707

8	2014 /IV /38	Rekonstrukcija putnog pravca Hadži i-Mezarje u MZ <b>Stjepan Polje</b> prema Malešima	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	54	0
9	2013 /IV /44	Rekonstrukcija puta u naselju Crkvine u MZ <b>Stjepan Polje</b>	48.000	0	47.355	47.355	0	0	0	0	0	0	0	54	645
10	B- 2015	budžet 2014-rekonstrukcija puta Donja Lohinja- <b>Gornja Lohinja</b>	230.000	203.665	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0		-665
11	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ <b>Gornji Dobrovci</b>	120.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	47	10.000
12	2011 /IV /47	<b>Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešima</b> (povećana vrijednost sa 80.000 na 200.000 KM)	200.000	107.955	83.874	83.874	0	0	0	0	0	0	0	47	8.171
13	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ <b>Mirićina</b>	75.000	0	31.132	31.132	0	0	0	0	0	0	0	38	43.868
14	2013 /A/I V	Budžet-sanacija vjerskih objekata na području <b>općine</b> (povećana vrijednost)	30.000	20.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	35	4.400
15	B- 2015	Budžet- rekonstrukcija puta u MZ <b>SOKO- Oštrikovac</b> -put prema Topagićima	14.000	0	13.668	13.668	0	0	0	0	0	0	0	35	332

16	B-2015	Budžet- rekonstrukcija puta u MZ <b>SOKO-</b> Bukva i Mehi i (put prema Hadži S i R.)	10.000	0	9.676	9.676	0	0	0	0	0	0	0	35	324
17	2016 /IV /46	Rekonstrukcija puta Džanani-Viništa - Rijeka u Mz <b>Gornji Dobrovci</b> (2016-2018)	50.000	0	36.491	36.491	0	0	0	0	0	0	0	33	13.509
18	B-2015	budžet 2014-most u MZ <b>Lukavica po ugovoru</b>	13.000	0	12.729	12.729	0	0	0	0	0	0	0		271
19	B-2015	Budžet- rekonstrukcija puta Lendi i-Drijena u MZ <b>Lendi i</b>	76.000	0	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0		0
20	B-2015	Budžet-izgradnja javne rasvjete u <b>MZ</b>	25.000	0	18.605	18.605	0	0	0	0	0	0	0		6.395
21	B-2015	Budžet-izgradnja javne rasvjete u <b>gradu</b>	20.000	0	6.367	6.367	0	0	0	0	0	0	0		13.633
22	B-2015	budžet-izgradnja javne rasvjete u centru grada, parku ispred općine i centralnom parku	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
23	B-2015	Budžet-komunalno održavanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje (povećana vrijednost)	320.000	187.436	125.585	125.585	0	0	0	0	0	0	0		6.979
24	B-2015	Budžet-održavanje puteva u <b>MZ</b> (povećana vrijednost)	30.000	0	24.876	24.876	0	0	0	0	0	0	0		5.124

25	B-2015	Budžet-održavanje puteva u <b>gradu</b> (pove ana vrijednost)	20.000	0	19.385	19.385	0	0	0	0	0	0	0	0	615
26	B-2015	Budžet-održavanje javne rasvjete u <b>MZ</b> (pove ana vrijednost)	30.000	0	27.863	27.863	0	0	0	0	0	0	0	0	2.137
27	B-2015	Budžet-održavanje javne rasvjete u <b>gradu</b> (pove ana vrijednost)	25.000	0	19.336	19.336									5.664
28	B-2015	Budžet-horizontalna, vertikalna signalizacija i obilježavanje naseljenih mjesta (pove ana vrijednost)	15.000	0	5.230	5.230	0	0	0	0	0	0	0	0	9.770
29	B-2015	Budžet-rekonstrukcija puteva u MZ <b>Piskavica</b>	20.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
30	B-2015	budžet -sanacija 3.mosta u MZ <b>Rašljeva</b>	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
31	B-2015	budžet -sanacija .mosta u MZ <b>Miri ina</b>	10.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
32	B-2015	Budžet-ostali kapitalni projekti <b>MZ</b>	30.000	0	20.633	20.633	0	0	0	0	0	0	0	0	9.367
33	B-2015	Budžet-sufinansiranje op ine u projektima fondova	50.000	0	42.584	42.584	0	0	0	0	0	0	0	0	7.416

34	B-2015	Budžet-izgradnja Društvenog doma - mjesnog uredau MZ Trnovci	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B-2015	rekonstrukcija nogometnog igrališta Luke Gra anica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B-2015	Budžet-rekonstrukcija puteva u MZ Prijeko Brdo	35.000	0	34.987	34.987	0	0	0	0	0	0	0	13	
37	B-2015	Budžetrekonstrukcij a -puta u MZ Pribava	60.000	0	40.521	40.521	0	0	0	0	0	0	0	19.479	
38	B-2015	Budžet-sanacija puta Prijeko Brdo-Džakule	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
UKUPNO KM			3.284.000	864.535	1.487.126	1.328.204	0	0	0	158.922	0	0	0	1.123	932.339

## GRUPA V

## OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodo vi	ostaje za realizaciju	
								PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani			Donacije
1	2012 /A /V /8	Opremanje struktura CZ –moderna zacija srevisa za punje nje protiv požarnih aparata-- izdaci za održavanje (pove ana vrijednost za 5175)	25.000	20.000	5.175	5.175	0	0	0	0	0	0	0	130	-175

2	2012 /A /V /12	Opremanje struktura CZ–stavljanje u funkciju repetitora Staževac u MZ <b>Pribavljena</b>	21.579	0	21.579	21.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B-2012	Nabavka kompjuterske opreme informacionog sistema <b>opina</b> (povećana vrijednost sa 10000 na 26000)	23.000	15.000	3.316	3.316	0	0	0	0	0	0	0	117	4.684
4	2012 /A /V /18	Nabavka softvera za elektronsko vođenje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravljanje dokumentima i zapisima u <b>opini</b>	20.000	19.719	281	281	0	0	0	0	0	0	0	112	0
5	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	81.329	6.999	6.999	0	0	0	0	0	0	0	108	11.672
6	2012 /A /V /21	Licenciranje nelicenciranih softvera koji se koriste u <b>Opini Građanica</b>	40.000	21.989	1.989	1.989	0	0	0	0	0	0	0	87	16.022
7	B-2014	Budžet- projekat digitalizacija u <b>katastru opine</b> (povećana vrijednost za 25.000)	50.000	10.358	25.519	25.519	0	0	0	0	0	0	0		14.123
8	B-2014	Budžet-nabavka PARKOMATA u gradu u MZ <b>Građanica</b> (povećana vrijednost sa 60000)	95.355	0	95.355	95.355	0	0	0	0	0	0	0		0

9	B-2014	Budžet-oprema za <b>sportsku salu</b> (ponovo-pove ana vrijednost sa 20000 na 25000)	25.000	21.894	969	969	0	0	0	0	0	0	0	2.137	
10	B-2014	Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u <b>općini</b> (ponovo-pove ana vrijednost za 10000)	20.000	5.000	9.408	9.408	0	0	0	0	0	0	0	5.592	
11	B-2014	Budžet-izgradnja spomen obilježje u <b>MZ Gornji Dobrovci</b>	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
12	B-2015	Budžet-kupovina zemljišta (ponovo-pove ana vrijednost)	15.000	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	11.700	
13	B-2013	Budžet-karta upotrebne vrijednosti zemljišta (ponovo-pove ana vrijednost sa 28000 na 75000)	75.000	27.988	18.659	18.659	0	0	0	0	0	0	0	28.353	
14	B-2014	Budžet-oprema za civilnu zaštitu	35.000	0	3.857	3.857	0	0	0	0	0	0	0	31.143	
15	B-2015	Budžet-harmonizacija podataka	10.000	0	6.000	3.000	0	0	0	3000	0	0	0	4.000	
16		Unapređenje poljoprivrednog zemljišta	50.000	0	38.411	38.411	0	0	0	0	0	0	0	11.589	
UKUPNO KM			614.934	223.277	250.817	242.817	0	0	0	3.000	0	5.000	0	554	140.840

## GRUPA VI

## KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodo vi	ostaje za realizaciju	
								PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani			Donacije
1	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeka Sokoluše (dionica od mosta Lido do uš a u rijeku Spre u) u <b>MZ Gra anica</b>	2.618.000	721.308	130.110	130.110	0	0	0	0	0	0	0	100	1.766.582
2	B- 2013	Budžet-otklanjanje posljedica elemen tarne nepogode	27.000	0	26.928	26.928	0	0	0	0	0	0	0		72
3	B- 2014	Budžet-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i ošte enih ku a usljed <b>elementarne nepogode u 2014.g.</b>	160.000	0	115.055	0	0	0	115.055	0	0	0	0		44.945
4		Budžet-kapitalni grant za izgradnju 7 objekata (poruše nih i ošte enih ku a usljed <b>elementarne nepogode u 2014.g.</b>	250.100	0	217.971	0	0	0	217.971	0	0	0	0		32.129
5	B- 2015	<b>BUDŽET</b> -kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli <b>posljedice priro dne nepogode</b>	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0		0



6	B-2014	Budžet- iš enje regulacije rijeke Sokoluše - <b>sanacija od prirodne nepogode 2014</b>	50.000	0	30.187	30.187	0	0	0	0	0	0	0	19.813
7	B-2014	BUDŽET 2014- kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli <b>posljedice prirodne nepogode</b>	60.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	20.000
8		BUDŽET -kapitalni grant fizi kim licima za otklanjanje <b>posljedica prirodne nepogode</b>	17.000	0	16.269	16.269	0	0	0	0	0	0	0	731
9	B-2014	BUDŽET 2014- sanacija kanalizacije u MZ Džakule - posljedice <b>elementarne nepogode</b>	12.000	0	11.524	0	0	0	11.524	0	0	0	0	476
10	B-2014	BUDŽET 2014- regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od <b>elementarne nepogode</b>	25.000	0	30.187	0	0	0	30.187	0	0	0	0	-5.187
11	B-2014	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendi i-sanacija od <b>prirodne nepogode</b>	20.000	0	5.255	5.255	0	0	0	0	0	0	0	14.745
12	B-2014	Izrada odvodnih kanala u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta "Polje" u MZ Donja Lohinja-II faza	38.104	0	38.104	38.104	0	0	0	0	0	0	0	0

13	B-2014	Budžet-sanacija klizišta	504.000	0	497.978	497.978	0	0	0	0	0	0	0	0	6.022
14	B-2015	obilježavanje i deminiranje minskih terena	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO KM			3.831.204	721.308	1.209.568	774.831	0	0	434.737	0	0	0	0	100	1.900.328

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA u 2015.godini  
iz PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP NE GRA ANICA 2010.-2014.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Realizacija u 2015.god										
			Izvori finansiranja								
grupa ↓	planirano za realiz u 2015	realizovano	VI.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	grani	donacije	ostaje za realizaciju
<b>GRUPA I</b>											
sport, kultura, potrebe manjina	1.177.578	<b>1.071.302</b>	693.647	0	300.000	62.655	0	0	5.000	10.000	106.276
<b>GRUPA II</b>											
toplifikacija, deminiranje	967.166	<b>907.166</b>	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	153.015	60.000
<b>GRUPA III</b>											
vodovod, kanalizacija	883.055	<b>613.454</b>	249.393	137.071	0	0	0	226.990	0	0	269.601
<b>GRUPA IV</b>											
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	2.693.192	<b>1.487.126</b>	1.328.204	0	0	0	158.922	0	0	0	1.206.066
<b>GRUPA V</b>											
oprema, dokumentacija	434.118	<b>250.817</b>	242.817	0	0	0	3.000	0	5.000	0	183.301
<b>GRUPA VI</b>											
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	1.209.568	<b>1.209.568</b>	774.831	0	0	434.737	0	0	0	0	0
<b>ukupno</b>	<b>7.364.677</b>	<b>5.539.433</b>	<b>3.298.258</b>	<b>137.071</b>	<b>309.366</b>	<b>497.392</b>	<b>897.341</b>	<b>226.990</b>	<b>10.000</b>	<b>163.015</b>	<b>1.825.244</b>

## ZAKLJUČAK

Pripremljen Program Kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2015-2016 nije predviđen planom i nije bio na razmatranju Općinskog vijeća u 2015.godini, uračunavan je

### **Izveštaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014**

kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, a svi projekti iz Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2010-2014 i novi projekti su uvršteni u novi program koji će biti na razmatranju.

Uračunavan je novi PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA ZA PERIOD OD 2016. do 2020.GODINE koji je bio na razmatranju Općinskog vijeća ali nije još usvojen

A pripremljen Program kapitalnih investicija 2016-2020 je po istom principu kao i ranije program i istoj metodologiji, u kojem su se uvrstiti svi nerealizovani projekti koji su bili u ranijem programu i projekti koji su pristigli kao novi po javnom pozivu iz 2015.

